

INFORME DE USO

Vehículo: SRBC TEST

Fecha: 09/03/2026

Ubicación: SABI AGRI

Misiones: 4

Misión 1

Fecha del ensayo	2026-03-09
Ubicación	SABI AGRI, Auvergne, France
Operador	Nicolas
Hora de inicio	09:20
Hora de fin	10:09
Clima	
Tipo de precipitación	Ninguna
Temperatura	15 °C
Posición del sol	Absent
Terreno	
Pendiente	0 %
Pendiente transversal	0 %
Suelo	
Textura	Franco arcilloso
Tamaño dominante de partícula	Grava 2-20 mm
Condición de humedad	Friable (óptimo)
Cultivo	
Etapa de crecimiento	Preparación del suelo
Presión de las malas hierbas	20 %
Operación planificada	Preparación del suelo
Entorno adyacente	
Vegetación alta	No
Edificios altos	No
Estructuras metálicas	Sí
Zanja o talud	Sí
Líneas de alta tensión	No
Camino	No

Zona sin red	No
Configuración del robot	
Peso del robot	280 kg
Anchura del robot	0.64 m
<i>Herramienta</i>	
Nombre de la herramienta	Herse estrille
Tipo de herramienta	Suspendido
Peso de la herramienta	15 kg
Longitud de la herramienta	0.8 m
Anchura de la herramienta	0.1 m
Altura de la herramienta	0.3 m
Longitud total de la herramienta	1.1 m
Profundidad de trabajo	0.18 m



Figura 1.1: Foto de presentación de la misión

Presentación de la misión

Parámetros de la misión

Tarea a realizar	Préparation finale du sol
Trayectoria	rectiligne, square turn
Velocidad de trabajo	2.88 km/h
Archivo de la misión	mission_carotte_2.json

Organización

<i>Mano de obra</i>	
Número total de empleados	1
Empleados en tarea robótica	0

Superficie

Superficie teórica de la parcela	0.04 ha
Superficie de parcela trabajada	0.0492 ha
Fragmentación de las parcelas	Consolidado (<0,5 km)

Trayectoria

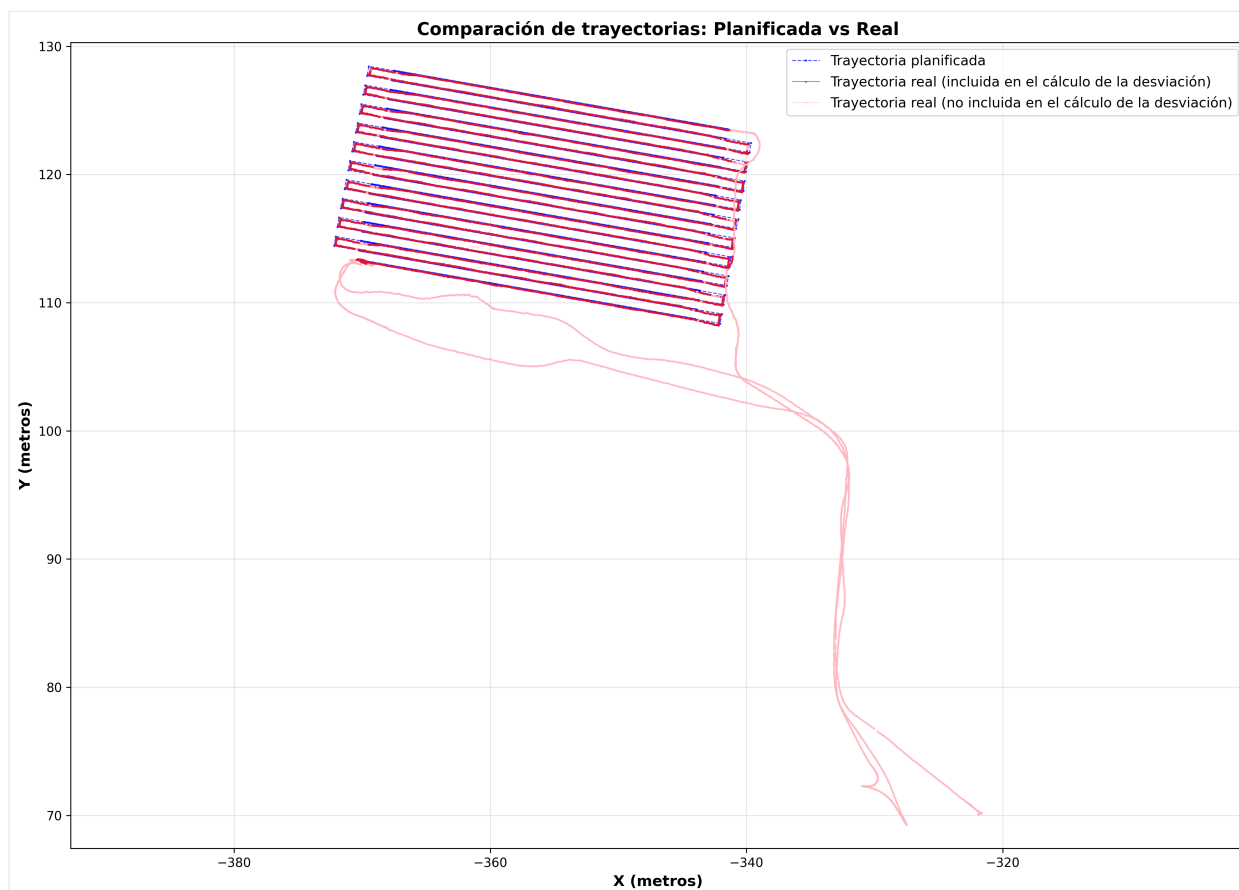


Figura 1.1: Comparación de la trayectoria planificada versus real

Resumen Agronómico

Energía por hectárea	5.02 kWh/ha
Ritmo de trabajo	0.08 ha/h
Autonomía por batería	0.51 ha/batterie

Seguimiento del tiempo

Ajuste de herramientas	5 min
Espera conexión GPS	10 min
Espera conexión Wi-Fi	0 min
Tiempo de supervisión	2 min

Tiempo de desplazamiento	5 min
Número de reinicios	0
Número de paradas	0

Evaluación del trabajo

Apreciación de la calidad	Globalmente satisfecho
Daños a los cultivos	Ninguno

Indicadores de rendimiento

Agronómico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Especie de cultivo	<i>N/D</i>	
Etapa de crecimiento	Preparación del suelo	
Textura del suelo	Franco arcilloso	
Humedad del suelo	Friable (óptimo)	
Presión de malezas	20	%
Operación planificada	Preparación del suelo	
Evaluación de la calidad del trabajo	Globalmente satisfecho	
Daños a los cultivos	Ninguno	


Energía ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC al inicio	61.40	%
SOC al final	49.00	%
Descarga total ^[3] <i>Para una capacidad del pack de batería de: 2.54 kWh</i>	13.22	%
Energía total consumida	0.34	kWh
Potencia media	0.40	kW
Energía por hectárea	5.02	kWh/ha
Autonomía por batería <i>Batería de referencia: 2.54 kWh</i>	0.51	ha/batterie

Ritmo de trabajo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Ritmo de trabajo ^[5]	0.08	ha/h

Indicateur	Valeur	Unité
Superficie recorrida ^[6]	0.07	ha
Superficie de parcela trabajada ^[7]	0.05	ha
Superficie trabajada ^[8]	0.01	ha
Superficie efectiva ^[9]	0.01	ha
Tasa de cobertura ^[10]	0.00	%
Velocidad media (km/h)	1.20	km/h
Velocidad máxima (km/h)	3.50	km/h

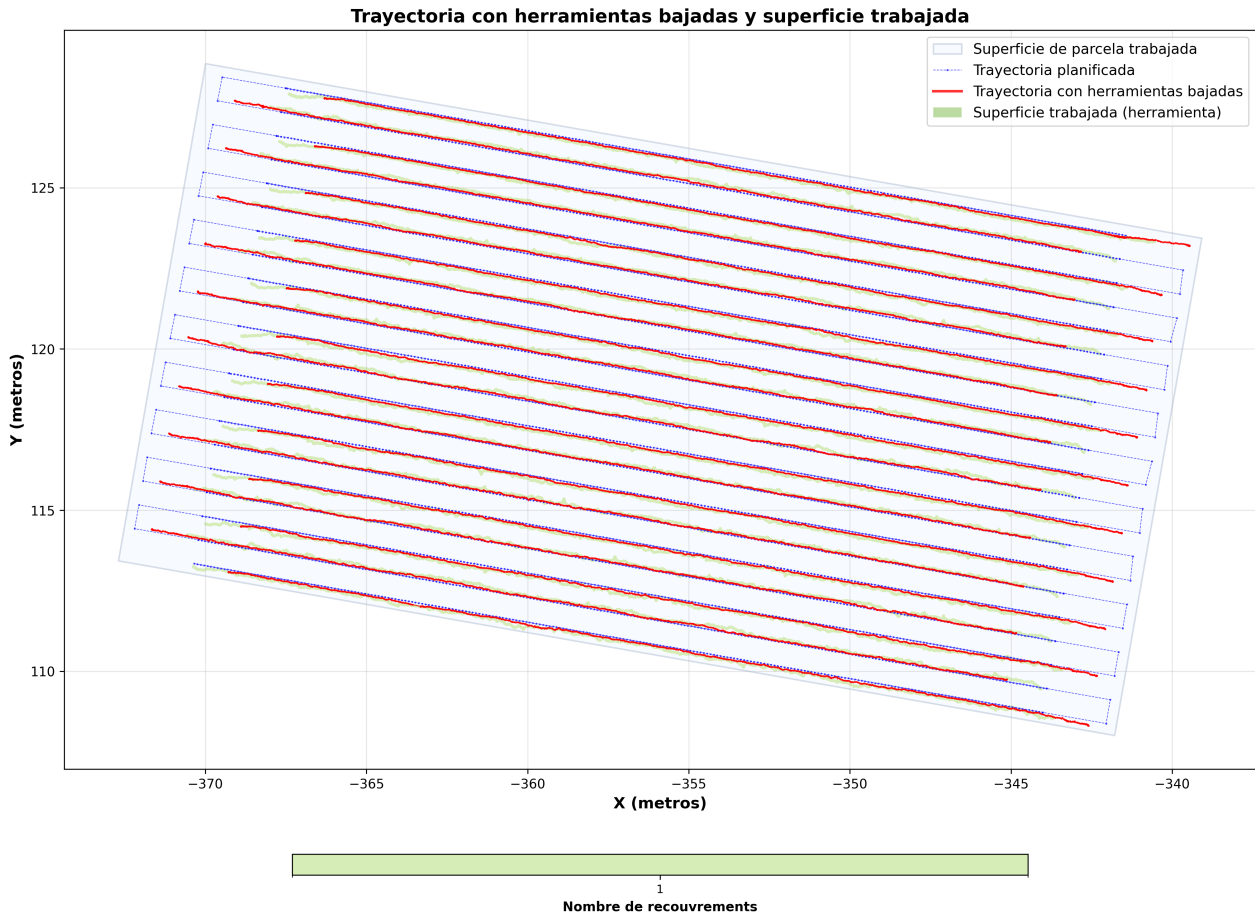

Económico ^[11]		
Indicateur	Valeur	Unité
Precio de la electricidad	0.19	€/kWh
Costo de mano de obra/hora	18.00	€/h
Empleados asignados	0	
Costo de mano de obra/ha	0.00	€/ha
Costo de energía	0.06	€

Indicateur	Valeur	Unité
Costo de energía/ha	0.95	€/ha
Costo total	0.06	€
Costo total/ha	0.95	€/ha

Ambiental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo de precipitación	Ninguna	
Emisiones de CO ₂ ^[13] <i>Factor de emisión aplicado: 317 g de CO₂ por kWh.</i>	0.11	kg
Fragmentación de la parcela	Consolidado (<0,5 km)	

Misión ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distancia planificada ^[15]	653.86	m
Distancia realizada ^[16]	1045.89	m
Desviación de distancia	392.02	m
Distancia realizada (%)	159.95	%
Desviación lateral media <i>Fuera de media vuelta</i>	6.13	cm
Desviación lateral máxima <i>Fuera de media vuelta</i>	19.99	cm
Desviación lateral media (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	9.70	cm
Desviación lateral máxima (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	20.00	cm
Surcos trabajados ^[17]	21	

Operacional ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso del robot	280.00	kg
Peso de la herramienta	N/D	kg
Peso total	280.00	kg
Energía/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Par medio en trabajo (% nominal) ^[19] <i>Par nominal de referencia: 2.39 N·m — Número de motores: 2.</i>	54.53	%

Seguridad ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Salidas de geoperímetro	2	
Tiempo fuera de geoperímetro (s)	784.06	s
Tiempo fuera de geoperímetro (h)	0.22	h
Paradas de emergencia locales	0	
Paradas de emergencia a distancia	0	
Activaciones del parachoques	0	

Fiabilidad ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de salidas	0	
Errores de entradas	0	
Errores de batería	0	
Errores de motores	0	
Errores de cilindros	0	
Total de errores	0	
Tiempo en error de salidas (s)	0.00	s
Tiempo en error de entradas (s)	0.00	s
Tiempo en error de batería (s)	0.00	s
Tiempo en error de motores (s)	0.00	s
Tiempo en error de cilindros (s)	0.00	s
Tiempo total en error (s)	0.00	s
Tasa de errores/h	0.00	/h
Disponibilidad del sistema	100.00	%

Localización ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de localización	0	
Tiempo en error (s)	0.00	s
Tiempo en error (h)	0.00	h

Tiempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Duración total	2995.60	s

Indicateur	Valeur	Unité
Duración total (horas)	0.83	h
Tiempo activo	1905.27	s
Tiempo activo (horas)	0.53	h
Tiempo inactivo	1090.33	s
Tiempo inactivo (horas)	0.30	h
Porcentaje activo (%)	63.60	%
Porcentaje inactivo (%)	36.40	%

Misión 2

Fecha del ensayo	2026-03-09
Ubicación	SABI AGRI, Auvergne, France
Operador	Nicolas
Hora de inicio	10:10
Hora de fin	11:09
Clima	
Tipo de precipitación	Ninguna
Temperatura	15 °C
Posición del sol	Absent
Terreno	
Pendiente	0 %
Pendiente transversal	0 %
Suelo	
Textura	Franco arcilloso
Tamaño dominante de partícula	Grava 2-20 mm
Condición de humedad	Friable (óptimo)
Cultivo	
Especie	Radis
Etapas de crecimiento	Germinación
Presión de las malas hierbas	10 %
Operación planificada	Siembra
Entorno adyacente	
Vegetación alta	No
Edificios altos	No
Estructuras metálicas	Sí
Zanja o talud	Sí
Líneas de alta tensión	No
Caminos	No
Zona sin red	No
Configuración del robot	
Peso del robot	280 kg
Anchura del robot	0.64 m

Herramienta

Nombre de la herramienta	Semoir
Tipo de herramienta	Suspendido
Longitud de la herramienta	0.8 m
Anchura de la herramienta	0.1 m
Altura de la herramienta	0.3 m
Longitud total de la herramienta	1.1 m
Profundidad de trabajo	0.18 m



Figura 2.1: Foto de presentación de la misión

Presentación de la misión

Parámetros de la misión

Tarea a realizar	Semis
Trayectoria	rectiligne, square turn
Velocidad de trabajo	0.72 km/h
Archivo de la misión	mission_semis_radis_parcelle_2.json

Organización

Mano de obra

Número total de empleados	1
Empleados en tarea robótica	0

Superficie

Superficie teórica de la parcela	0.02 ha
Superficie de parcela trabajada	0.0247 ha
	Consolidado (<0,5 km)

Trayectoria

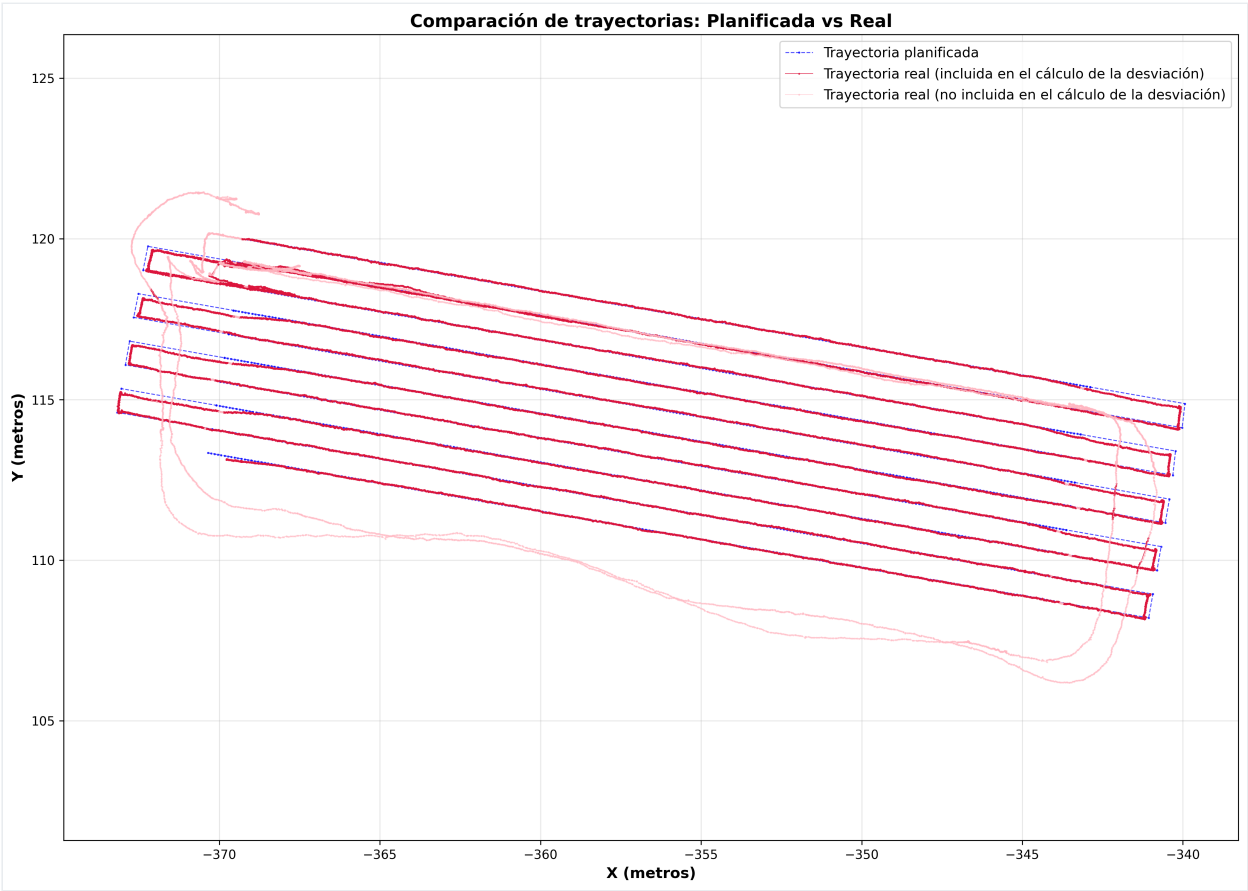


Figura 2.1: Comparación de la trayectoria planificada versus real

Resumen Agronómico

Energía por hectárea	3.87 kWh/ha
Ritmo de trabajo	0.05 ha/h
Autonomía por batería	0.66 ha/batterie
Seguimiento del tiempo	
Ajuste de herramientas	10 min
Espera conexión GPS	0 min
Espera conexión Wi-Fi	0 min
Tiempo de supervisión	30 min
Tiempo de desplazamiento	5 min
Número de reinicios	3
Número de paradas	3
Causas de parada	rangée 9, outils ne se baissent pas

Evaluación del trabajo

Apreciación de la calidad	Globalmente satisfecho
Daños a los cultivos	Ninguno

Indicadores de rendimiento

Agronómico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Especie de cultivo	Radis	
Etapa de crecimiento	Germinación	
Textura del suelo	Franco arcilloso	
Humedad del suelo	Friable (óptimo)	
Presión de malezas	10	%
Operación planificada	Siembra	
Evaluación de la calidad del trabajo	Globalmente satisfecho	
Daños a los cultivos	Ninguno	


Energía ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC al inicio	49.00	%
SOC al final	42.00	%
Descarga total ^[3] <i>Para una capacidad del pack de batería de: 2.54 kWh</i>	7.57	%
Energía total consumida	0.19	kWh
Potencia media	0.19	kW
Energía por hectárea	3.87	kWh/ha
Autonomía por batería <i>Batería de referencia: 2.54 kWh</i>	0.66	ha/batterie

Ritmo de trabajo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Ritmo de trabajo ^[5]	0.05	ha/h
Superficie recorrida ^[6]	0.05	ha
Superficie de parcela trabajada ^[7]	0.02	ha
Superficie trabajada ^[8]	0.00	ha

Indicateur	Valeur	Unité
Superficie efectiva ^[9]	0.00	ha
Tasa de cobertura ^[10]	0.85	%
Velocidad media (km/h)	0.66	km/h
Velocidad máxima (km/h)	3.60	km/h

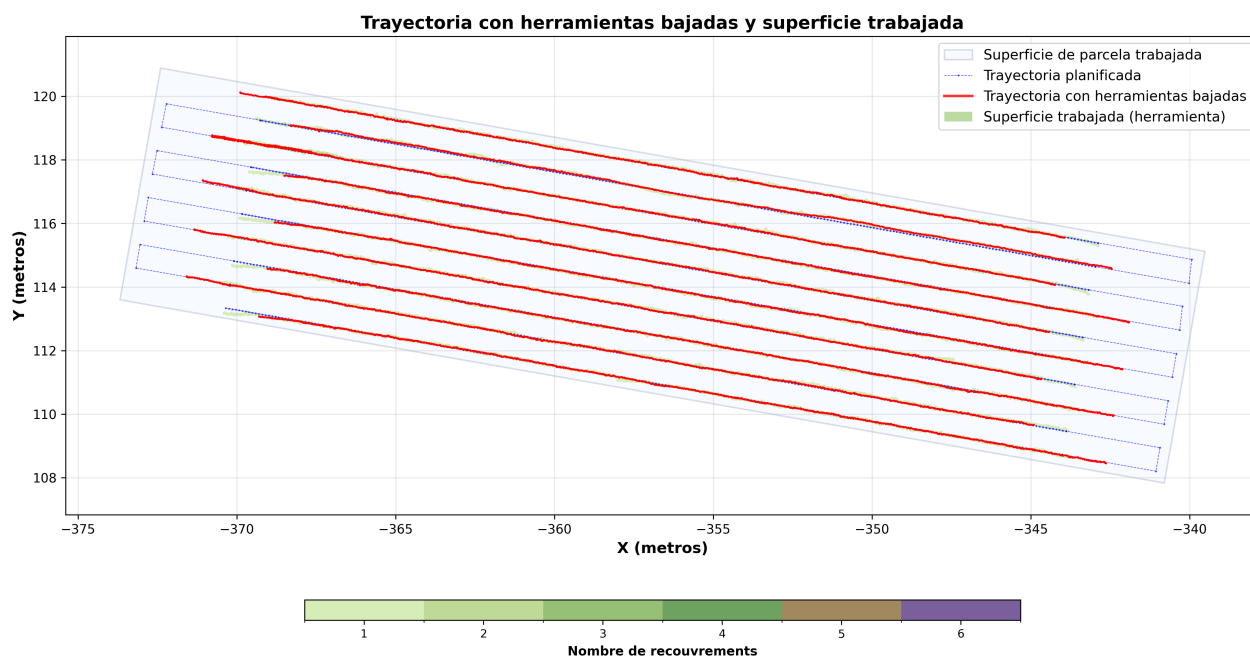

Económico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Precio de la electricidad	0.19	€/kWh
Costo de mano de obra/hora	18.00	€/h
Empleados asignados	0	
Costo de mano de obra/ha	0.00	€/ha
Costo de energía	0.04	€
Costo de energía/ha	0.74	€/ha
Costo total	0.04	€
Costo total/ha	0.74	€/ha

Ambiental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo de precipitación	Ninguna	

Indicateur	Valeur	Unité
Emisiones de CO ₂ ^[13] <i>Factor de emisión aplicado: 317 g de CO₂ por kWh.</i>	0.06	kg
Fragmentación de la parcela	Consolidado (<0,5 km)	

Misión ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distancia planificada ^[15]	327.83	m
Distancia realizada ^[16]	777.46	m
Desviación de distancia	449.63	m
Distancia realizada (%)	237.16	%
Desviación lateral media <i>Fuera de media vuelta</i>	2.24	cm
Desviación lateral máxima <i>Fuera de media vuelta</i>	19.74	cm
Desviación lateral media (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	2.91	cm
Desviación lateral máxima (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	19.99	cm
Surcos trabajados ^[17]	10	

Operacional ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso del robot	280.00	kg
Peso de la herramienta	N/D	kg
Peso total	280.00	kg
Energía/kg/ha	0.01	kWh/kg/ha
Par medio en trabajo (% nominal) ^[19] <i>Par nominal de referencia: 2.39 N·m — Número de motores: 2.</i>	41.75	%

Seguridad ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Salidas de geoperímetro	0	
Tiempo fuera de geoperímetro (s)	0.00	s
Tiempo fuera de geoperímetro (h)	0.00	h
Paradas de emergencia locales	1	
Paradas de emergencia a distancia	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Activaciones del parachoques	0	

Fiabilidad ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de salidas	0	
Errores de entradas	0	
Errores de batería	0	
Errores de motores	0	
Errores de cilindros	0	
Total de errores	0	
Tiempo en error de salidas (s)	0.00	s
Tiempo en error de entradas (s)	0.00	s
Tiempo en error de batería (s)	0.00	s
Tiempo en error de motores (s)	0.00	s
Tiempo en error de cilindros (s)	0.00	s
Tiempo total en error (s)	0.00	s
Tasa de errores/h	0.00	/h
Disponibilidad del sistema	100.00	%

Localización ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de localización	0	
Tiempo en error (s)	0.00	s
Tiempo en error (h)	0.00	h

Tiempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Duración total	3599.93	s
Duración total (horas)	1.00	h
Tiempo activo	2292.07	s
Tiempo activo (horas)	0.64	h
Tiempo inactivo	1307.86	s
Tiempo inactivo (horas)	0.36	h
Porcentaje activo (%)	63.67	%

Indicateur	Valeur	Unité
Porcentaje inactivo (%)	36 . 33	%

Misión 3

Fecha del ensayo	2026-03-09
Ubicación	SABI AGRI, Auvergne, France
Operador	Nicolas
Hora de inicio	11:10
Hora de fin	12:09
Clima	
Tipo de precipitación	Ninguna
Temperatura	15 °C
Posición del sol	Absent
Terreno	
Pendiente	0 %
Pendiente transversal	0 %
Suelo	
Textura	Franco arcilloso
Tamaño dominante de partícula	Grava 2-20 mm
Condición de humedad	Friable (óptimo)
Cultivo	
Especie	Carotte
Etapas de crecimiento	Germinación
Presión de las malas hierbas	10 %
Operación planificada	Siembra
Entorno adyacente	
Vegetación alta	No
Edificios altos	No
Estructuras metálicas	Sí
Zanja o talud	Sí
Líneas de alta tensión	No
Caminos	No
Zona sin red	No
Configuración del robot	
Peso del robot	280 kg
Anchura del robot	0.64 m

Herramienta

Nombre de la herramienta	Semoir
Tipo de herramienta	Suspendido
Longitud de la herramienta	0.8 m
Anchura de la herramienta	0.1 m
Altura de la herramienta	0.3 m
Longitud total de la herramienta	1.1 m
Profundidad de trabajo	0.18 m



Figura 3.1: Foto de presentación de la misión

Presentación de la misión

Parámetros de la misión

Tarea a realizar	Semis
Trayectoria	rectiligne, square turn
Velocidad de trabajo	0.72 km/h
Archivo de la misión	mission_semis_carotte_parcelle_2.json

Organización

Mano de obra

Número total de empleados	1
Empleados en tarea robótica	0

Superficie

Superficie teórica de la parcela	0.02 ha
Superficie de parcela trabajada	0.0271 ha
	Consolidado (<0,5 km)

Trayectoria

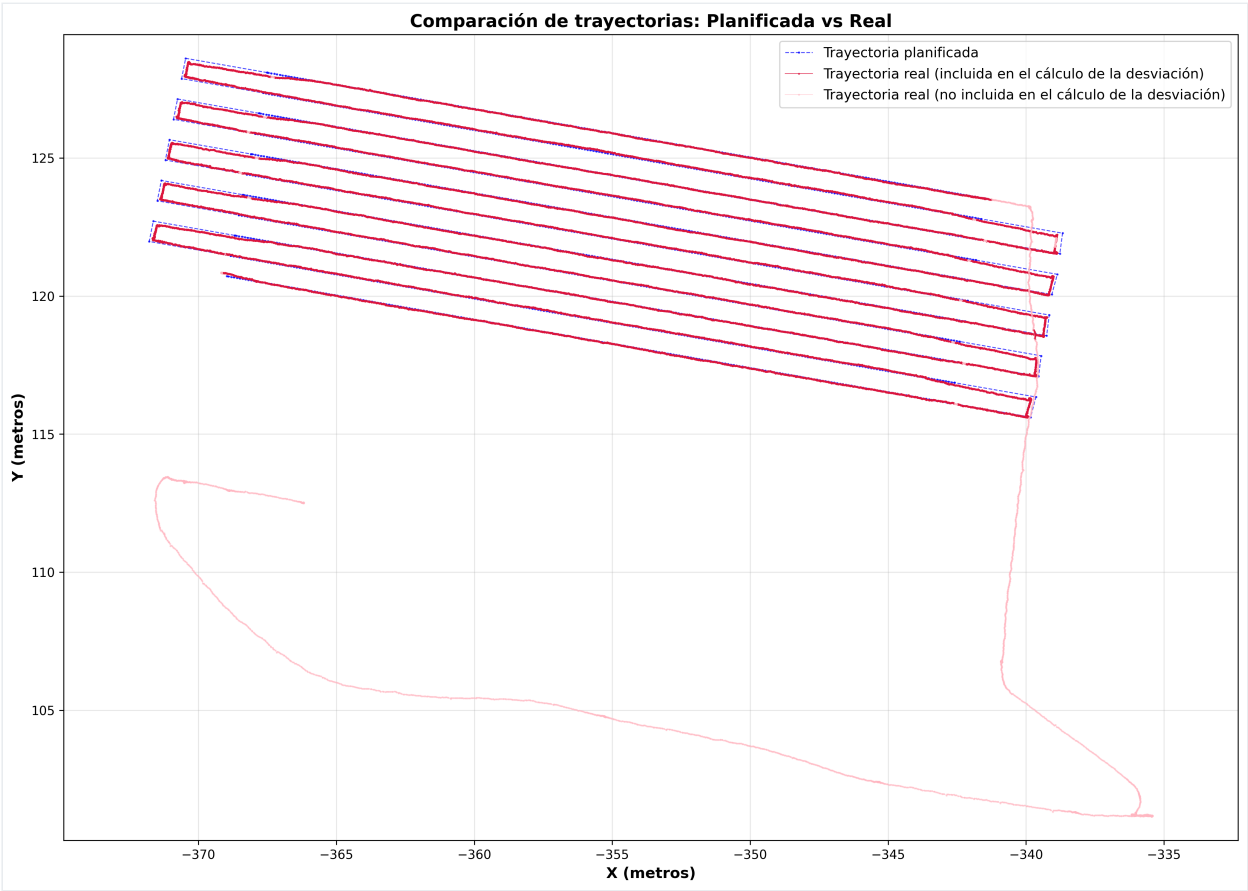


Figura 3.1: Comparación de la trayectoria planificada versus real

Resumen Agronómico

Energía por hectárea	3.84 kWh/ha
Ritmo de trabajo	0.04 ha/h
Autonomía por batería	0.66 ha/batterie
Seguimiento del tiempo	
Ajuste de herramientas	10 min
Espera conexión GPS	0 min
Espera conexión Wi-Fi	0 min
Tiempo de supervisión	10 min
Tiempo de desplazamiento	0 min
Número de reinicios	0
Número de paradas	0
Evaluación del trabajo	

Apreciación de la calidad	Muy satisfecho
Daños a los cultivos	Ninguno

Indicadores de rendimiento

Agronómico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Especie de cultivo	Carotte	
Etapas de crecimiento	Germinación	
Textura del suelo	Franco arcilloso	
Humedad del suelo	Friable (óptimo)	
Presión de malezas	10	%
Operación planificada	Siembra	
Evaluación de la calidad del trabajo	Muy satisfecho	
Daños a los cultivos	Ninguno	


Energía ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC al inicio	42.00	%
SOC al final	36.20	%
Descarga total ^[3] <i>Para una capacidad del pack de batería de: 2.54 kWh</i>	6.25	%
Energía total consumida	0.16	kWh
Potencia media	0.16	kW
Energía por hectárea	3.84	kWh/ha
Autonomía por batería <i>Batería de referencia: 2.54 kWh</i>	0.66	ha/batterie

Ritmo de trabajo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Ritmo de trabajo ^[5]	0.04	ha/h
Superficie recorrida ^[6]	0.04	ha
Superficie de parcela trabajada ^[7]	0.03	ha
Superficie trabajada ^[8]	0.00	ha
Superficie efectiva ^[9]	0.00	ha

Indicateur	Valeur	Unité
Tasa de cobertura ^[10]	0.01	%
Velocidad media (km/h)	0.58	km/h
Velocidad máxima (km/h)	3.60	km/h

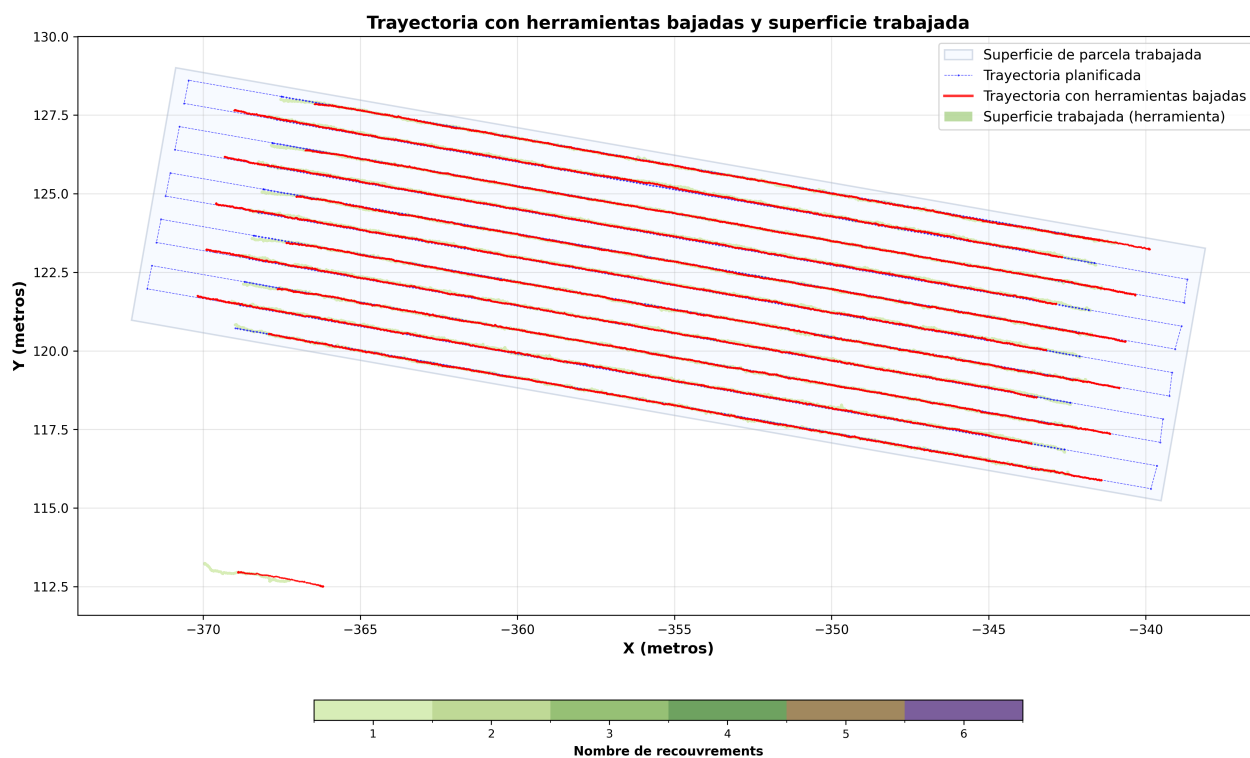

Económico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Precio de la electricidad	0.19	€/kWh
Costo de mano de obra/hora	18.00	€/h
Empleados asignados	0	
Costo de mano de obra/ha	0.00	€/ha
Costo de energía	0.03	€
Costo de energía/ha	0.73	€/ha
Costo total	0.03	€
Costo total/ha	0.73	€/ha

Ambiental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo de precipitación	Ninguna	

Indicateur	Valeur	Unité
Emisiones de CO ₂ ^[13] <i>Factor de emisión aplicado: 317 g de CO₂ por kWh.</i>	0.05	kg
Fragmentación de la parcela	Consolidado (<0,5 km)	

Misión ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distancia planificada ^[15]	359.29	m
Distancia realizada ^[16]	648.04	m
Desviación de distancia	288.75	m
Distancia realizada (%)	180.37	%
Desviación lateral media <i>Fuera de media vuelta</i>	1.74	cm
Desviación lateral máxima <i>Fuera de media vuelta</i>	19.92	cm
Desviación lateral media (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	2.69	cm
Desviación lateral máxima (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	19.95	cm
Surcos trabajados ^[17]	11	

Operacional ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso del robot	280.00	kg
Peso de la herramienta	N/D	kg
Peso total	280.00	kg
Energía/kg/ha	0.01	kWh/kg/ha
Par medio en trabajo (% nominal) ^[19] <i>Par nominal de referencia: 2.39 N·m — Número de motores: 2.</i>	34.41	%

Seguridad ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Salidas de geoperímetro	0	
Tiempo fuera de geoperímetro (s)	0.00	s
Tiempo fuera de geoperímetro (h)	0.00	h
Paradas de emergencia locales	2	
Paradas de emergencia a distancia	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Activaciones del parachoques	0	

Fiabilidad ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de salidas	0	
Errores de entradas	0	
Errores de batería	0	
Errores de motores	2	
Errores de cilindros	2	
Total de errores	4	
Tiempo en error de salidas (s)	0.00	s
Tiempo en error de entradas (s)	0.00	s
Tiempo en error de batería (s)	0.00	s
Tiempo en error de motores (s)	4.79	s
Tiempo en error de cilindros (s)	4.14	s
Tiempo total en error (s)	4.82	s
Tasa de errores/h	4.00	/h
Disponibilidad del sistema	99.87	%

Localización ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de localización	0	
Tiempo en error (s)	0.00	s
Tiempo en error (h)	0.00	h

Tiempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Duración total	3599.87	s
Duración total (horas)	1.00	h
Tiempo activo	2290.30	s
Tiempo activo (horas)	0.64	h
Tiempo inactivo	1309.57	s
Tiempo inactivo (horas)	0.36	h
Porcentaje activo (%)	63.62	%

Indicateur	Valeur	Unité
Porcentaje inactivo (%)	36 . 38	%

Misión 4

Fecha del ensayo	2026-03-09
Ubicación	SABI AGRI, Auvergne, France
Operador	Nicolas
Hora de inicio	12:10
Hora de fin	14:33
Clima	
Tipo de precipitación	Ninguna
Temperatura	15 °C
Posición del sol	Absent
Terreno	
Pendiente	0 %
Pendiente transversal	0 %
Suelo	
Textura	Franco arcilloso
Tamaño dominante de partícula	Grava 2-20 mm
Condición de humedad	Friable (óptimo)
Cultivo	
Especie	Carotte
Etapas de crecimiento	Germinación
Presión de las malas hierbas	10 %
Operación planificada	Binado
Entorno adyacente	
Vegetación alta	No
Edificios altos	No
Estructuras metálicas	Sí
Zanja o talud	Sí
Líneas de alta tensión	No
Caminos	No
Zona sin red	No
Configuración del robot	
Peso del robot	280 kg
Anchura del robot	0.64 m

Herramienta

Nombre de la herramienta	Bineuse
Tipo de herramienta	Suspendido
Longitud de la herramienta	0.8 m
Anchura de la herramienta	0.1 m
Altura de la herramienta	0.3 m
Longitud total de la herramienta	1.1 m
Profundidad de trabajo	0.18 m



Figura 4.1: Foto de presentación de la misión

Presentación de la misión

Parámetros de la misión

Tarea a realizar	Binage
Trayectoria	rectiligne, square turn
Velocidad de trabajo	0.72 km/h
Archivo de la misión	mission_binage_parcelle_complete.json

Organización

Mano de obra

Número total de empleados	1
Empleados en tarea robótica	0

Superficie

Superficie teórica de la parcela	0.084 ha
Superficie de parcela trabajada	0.1047 ha
Consolidado (<0,5 km)	

Trayectoria

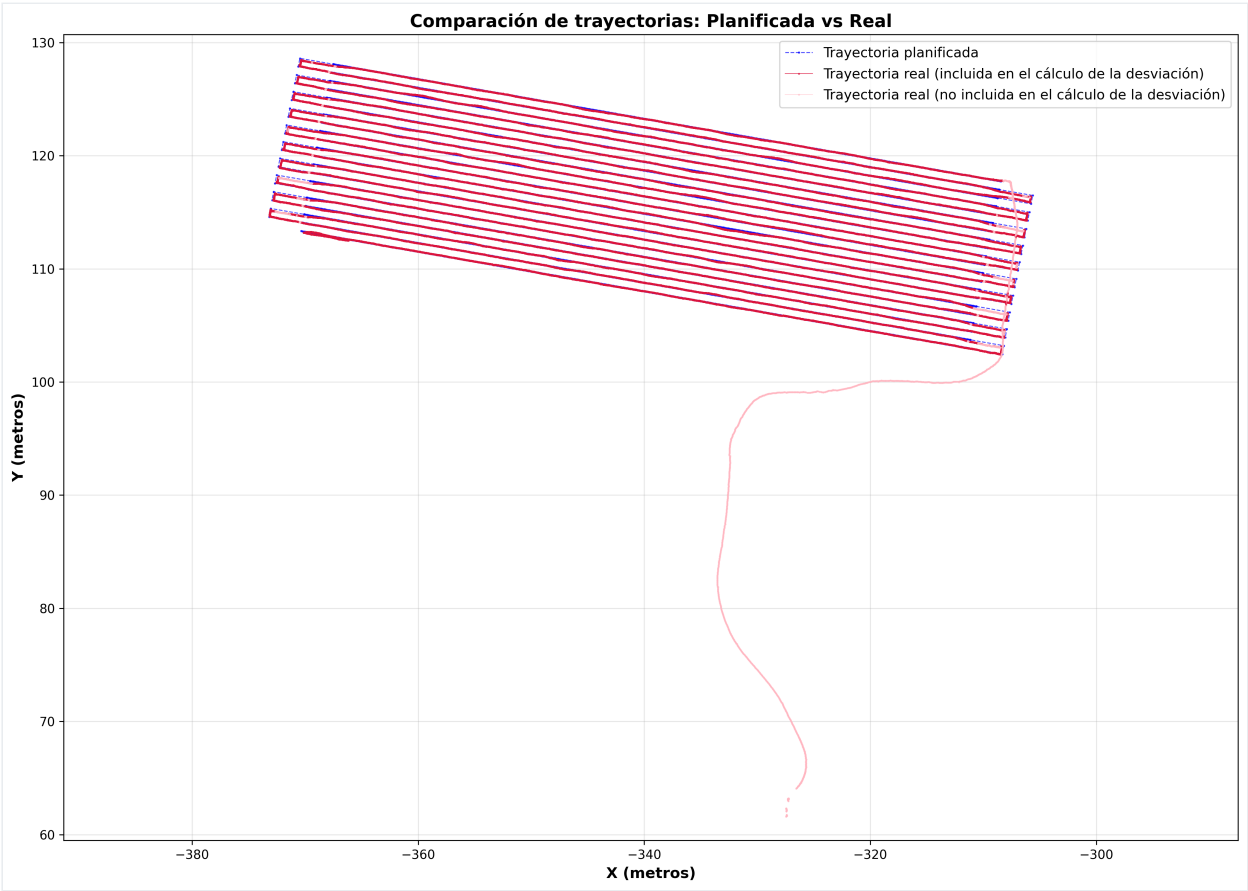


Figura 4.1: Comparación de la trayectoria planificada versus real

Resumen Agronómico

Energía por hectárea	5.76 kWh/ha
Ritmo de trabajo	0.05 ha/h
Autonomía por batería	0.44 ha/batterie

Seguimiento del tiempo

Ajuste de herramientas	2 min
Espera conexión GPS	0 min
Espera conexión Wi-Fi	0 min
Tiempo de supervisión	20 min
Tiempo de desplazamiento	0 min
Número de reinicios	0
Número de paradas	0

Evaluación del trabajo

Apreciación de la calidad	Globalmente satisfecho
Daños a los cultivos	Ninguno

Indicadores de rendimiento

Agronómico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Especie de cultivo	Carotte	
Etapas de crecimiento	Germinación	
Textura del suelo	Franco arcilloso	
Humedad del suelo	Friable (óptimo)	
Presión de malezas	10	%
Operación planificada	Binado	
Evaluación de la calidad del trabajo	Globalmente satisfecho	
Daños a los cultivos	Ninguno	


Energía ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC al inicio	36.20	%
SOC al final	7.70	%
Descarga total ^[3] <i>Para una capacidad del pack de batería de: 2.54 kWh</i>	29.24	%
Energía total consumida	0.74	kWh
Potencia media	0.31	kW
Energía por hectárea	5.76	kWh/ha
Autonomía por batería <i>Batería de referencia: 2.54 kWh</i>	0.44	ha/batterie

Ritmo de trabajo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Ritmo de trabajo ^[5]	0.05	ha/h
Superficie recorrida ^[6]	0.13	ha
Superficie de parcela trabajada ^[7]	0.10	ha
Superficie trabajada ^[8]	0.01	ha
Superficie efectiva ^[9]	0.01	ha

Indicateur	Valeur	Unité
Tasa de cobertura ^[10]	0.00	%
Velocidad media (km/h)	0.63	km/h
Velocidad máxima (km/h)	3.57	km/h

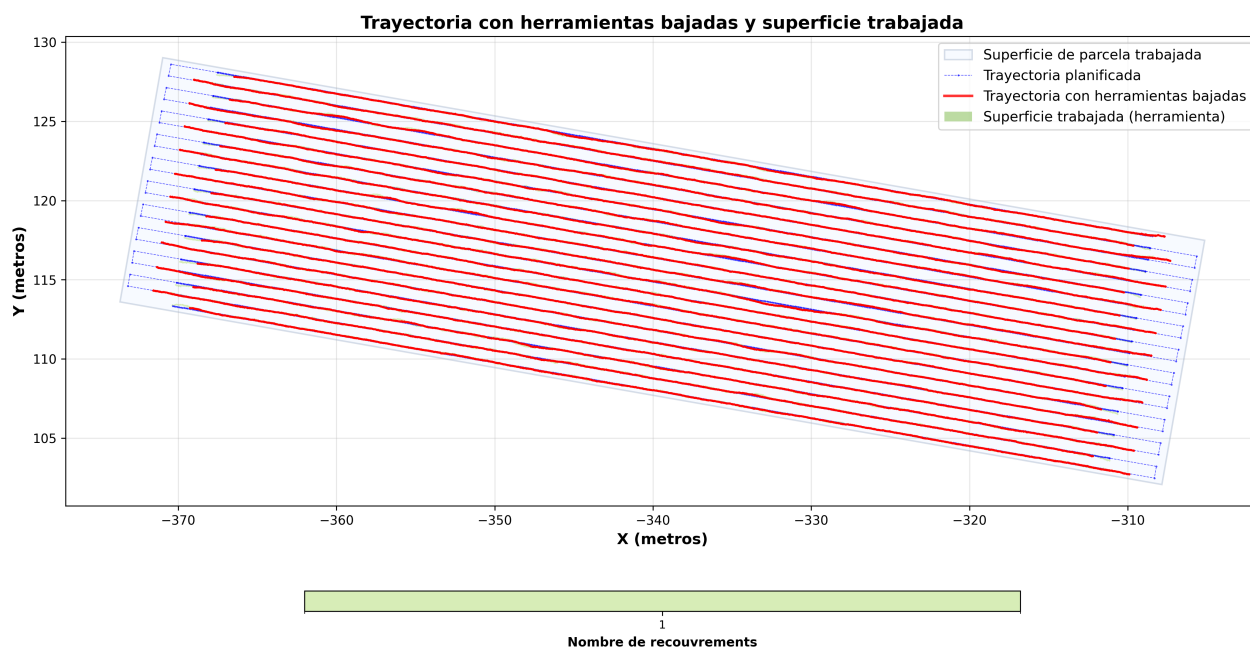

Económico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Precio de la electricidad	0.19	€/kWh
Costo de mano de obra/hora	18.00	€/h
Empleados asignados	0	
Costo de mano de obra/ha	0.00	€/ha
Costo de energía	0.14	€
Costo de energía/ha	1.09	€/ha
Costo total	0.14	€
Costo total/ha	1.09	€/ha

Ambiental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo de precipitación	Ninguna	
Emisiones de CO ₂ ^[13]	0.24	kg
Factor de emisión aplicado: 317 g de CO ₂ por kWh.		

Indicateur	Valeur	Unité
Fragmentación de la parcela	Consolidado (<0,5 km)	

Misión ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distancia planificada ^[15]	1394.53	m
Distancia realizada ^[16]	2017.21	m
Desviación de distancia	622.68	m
Distancia realizada (%)	144.65	%
Desviación lateral media <i>Fuera de media vuelta</i>	2.57	cm
Desviación lateral máxima <i>Fuera de media vuelta</i>	19.98	cm
Desviación lateral media (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	3.53	cm
Desviación lateral máxima (herramienta) <i>Sin media vuelta, distancia herramienta: 110 cm</i>	19.95	cm
Surcos trabajados ^[17]	21	

Operacional ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso del robot	280.00	kg
Peso de la herramienta	N/D	kg
Peso total	280.00	kg
Energía/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Par medio en trabajo (% nominal) ^[19] <i>Par nominal de referencia: 2.39 N·m — Número de motores: 2.</i>	66.02	%

Seguridad ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Salidas de geoperímetro	0	
Tiempo fuera de geoperímetro (s)	0.00	s
Tiempo fuera de geoperímetro (h)	0.00	h
Paradas de emergencia locales	1	
Paradas de emergencia a distancia	0	
Activaciones del parachoques	0	

Fiabilidad ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de salidas	0	
Errores de entradas	0	
Errores de batería	0	
Errores de motores	3	
Errores de cilindros	2	
Total de errores	5	
Tiempo en error de salidas (s)	0.00	s
Tiempo en error de entradas (s)	0.00	s
Tiempo en error de batería (s)	0.00	s
Tiempo en error de motores (s)	4.41	s
Tiempo en error de cilindros (s)	3.49	s
Tiempo total en error (s)	4.43	s
Tasa de errores/h	2.09	/h
Disponibilidad del sistema	99.95	%

Localización ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errores de localización	3	
Tiempo en error (s)	93.00	s
Tiempo en error (h)	0.03	h

Tiempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Duración total	8614.00	s
Duración total (horas)	2.39	h
Tiempo activo	7411.69	s
Tiempo activo (horas)	2.06	h
Tiempo inactivo	1202.31	s
Tiempo inactivo (horas)	0.33	h
Porcentaje activo (%)	86.04	%
Porcentaje inactivo (%)	13.96	%

Descriptions de los indicadores

Los números entre corchetes remiten a definiciones, hipótesis y fuentes detalladas a continuación.

- [1] Indicador agronómico: valor del contexto del ensayo registrado.
- [2] Indicador energético: derivado de medidas eléctricas, consumo y SOC durante la misión.
- [3] Descarga total (%): energía consumida durante la misión (variación del acumulado de energía en kWh) dividida por la capacidad nominal del pack de baterías (kWh), multiplicada por 100. Este indicador no se basa en el SOC inicial ni final; la capacidad de referencia del pack se indica en la nota cuando se conoce.
- [4] Indicador de rendimiento de trabajo: derivado de superficies, velocidades y tiempo en parcela.
- [5] Ritmo de trabajo: cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, en ha/h. Ritmo horario = superficie recorrida (ha) ÷ duración total de la misión (h).
- [6] Superficie recorrida: es la superficie barrida por el robot = distancia odométrica acumulada × ancho del robot.
- [7] Superficie de parcela trabajada: superficie de la parcela trabajada por el robot. Se modela con una caja orientada (OBB) y un margen igual a la mitad del ancho del robot alrededor de la trayectoria planificada que se ha trabajado.
- [8] Superficie trabajada: superficie trabajada por el apero (ancho de trabajo × longitud de la trayectoria con apero abajo). Cada paso cuenta; los solapes se suman.
- [9] Superficie efectiva: superficie trabajada por el apero excluyendo los solapes.
- [10] Tasa de cobertura: relación entre la superficie trabajada y la efectiva. $(\text{trabajada} - \text{efectiva}) / \text{efectiva} \times 100$. Un valor alto indica muchos pasos sobre las mismas zonas.
- [11] Indicador económico: calculado a partir de costes y agregados de energía/tiempo de misión.
- [12] Indicador ambiental: derivado del contexto meteorológico o del consumo según el método documentado.
- [13] Emisiones de CO₂ por electricidad de red consumida en la misión (kWh × 0,317 kg/kWh). Fuente: Estadísticas del desarrollo sostenible — Cifras clave del clima (edición digital), capítulo emisiones de GEI de la industria / producción eléctrica (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
- [14] Indicador de misión: derivado de la trayectoria real, el plan y las desviaciones geométricas.
- [15] Distancia teórica de la misión: longitud acumulada de la trayectoria planificada del archivo JSON de misión. No coincide con la trayectoria real del robot.
- [16] Distancia realmente recorrida por el robot. Puede incluir desplazamientos antes del inicio efectivo de la misión y después del fin, según los datos grabados.
- [17] Número de surcos distintos trabajados (herramienta bajada).
- [18] Indicador operativo: derivado de la cinemática, el apero o las masas documentadas.
- [19] Media del par motor en valor absoluto solo con la herramienta bajada, en % del par nominal de los motores.
- [20] Indicador de seguridad: derivado de eventos y tiempos ligados a las funciones de seguridad.
- [21] Indicador de fiabilidad: derivado de códigos de fallo y tiempo en error por subsistema.
- [22] Indicador de localización: derivado de fallos o tiempos sin localización válida.
- [23] Indicador temporal: derivado de marcas de tiempo y estados de actividad.
