

RAPPORT D'USAGE

Véhicule: SRBC TEST

Date: 18/03/2026

Lieu: SABI AGRI

Missions: 3

Mission 1

Date de l'essai	2026-03-18
Lieu	SABI AGRI, Auvergne, France
Opérateur	Nicolas
Heure de début	09:40
Heure de fin	15:34
Météo	
Type de précipitation	Aucune
Température	17 °C
Position du soleil	Zenith
Terrain	
Pente	0 %
Pente transversale	0 %
Sol	
Texture	Limon argileux
Taille de particule dominante	Pierres 20-200 mm
Condition d'humidité	Friable optimal
Culture	
Espèce	Carottes et Radis
Stade de croissance	Levée
Pression des adventices	5 %
Opération planifiée	Grattage
Environnement adjacent	
Végétation haute	Non
Bâtiments élevés	Non
Structures métalliques	Oui
Fossé ou talus	Oui
Lignes haute tension	Non

Routes	Non
Zone sans réseau	Non
Configuration robot	
Poids du robot	280 kg
Largeur du robot	0.64 m
<i>Outil</i>	
Nom de l'outil	Herse Etri
Type d'outil	Tiré
Poids de l'outil	15 kg
Longueur de l'outil	0.8 m
Largeur de l'outil	0.6 m
Hauteur de l'outil	0.6 m
Longueur totale de l'outil	1.1 m
Profondeur de travail	0.07 m



Figure 1.1: Photo de présentation de la mission

Présentation de la mission

Paramètres de mission

Tâche à effectuer	Grattage
Trajectoire	Rectiligne, square turn, Boucle
Vitesse de travail	3 km/h
Fichier de mission	mission_complete_inter_rang_boucle.json

Organisation

<i>Main d'œuvre</i>	
Nombre total d'employés	1
<i>Surface</i>	
	0.08 ha

Surface théorique de la parcelle

Surface de parcelle travaillée 0.0984 ha

Fragmentation des parcelles Consolidé (<0,5 km)

Trajectoire

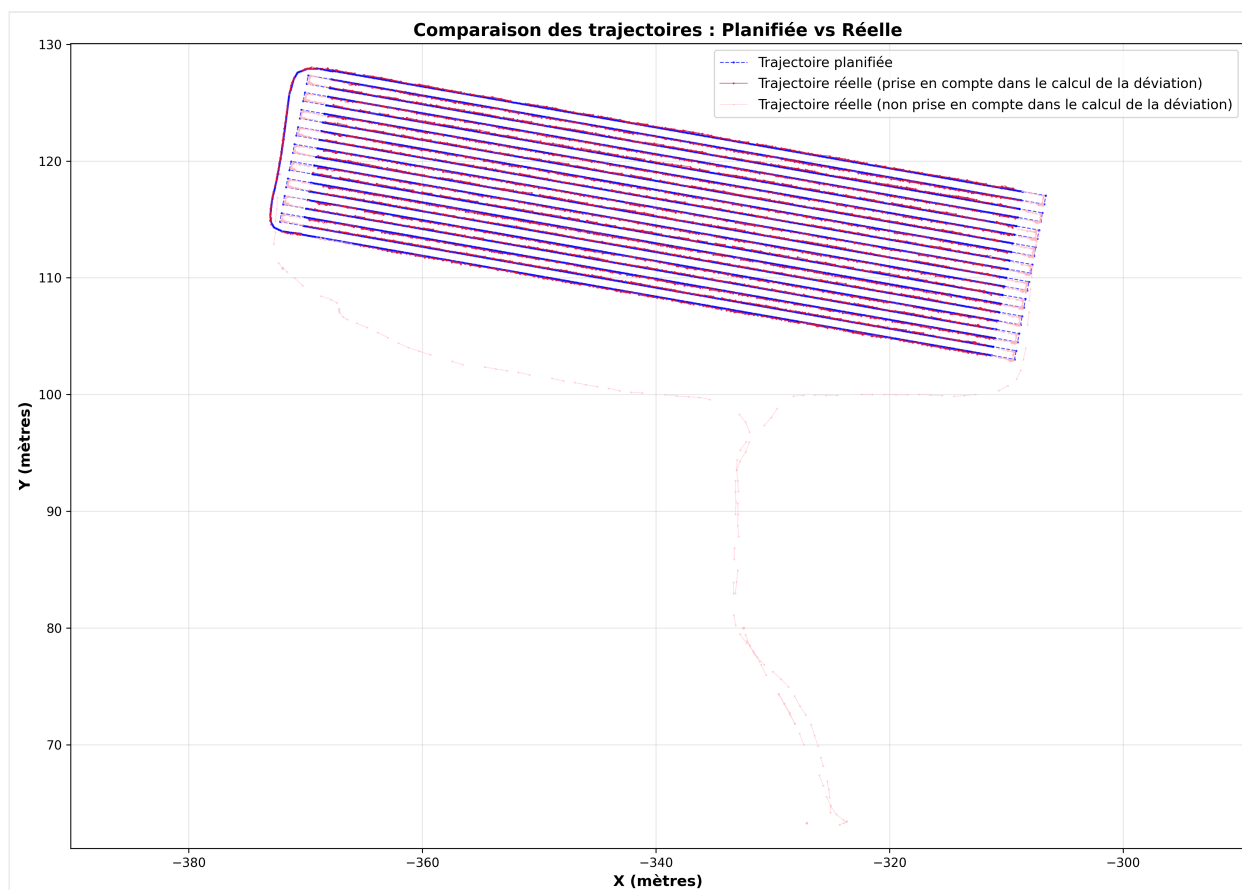


Figure 1.1: Comparaison trajectoire planifiée vs réelle

Synthèse Agronomique

Énergie par hectare 5.72 kWh/ha

Débit de chantier 0.06 ha/h

Autonomie par batterie 0.44 ha/batterie

Suivi du temps

Réglage outils 0 min

Attente connexion GPS 10 min

Attente connexion Wi-Fi 0 min

Temps supervision 5 min

Déplacement 5 min

Nombre de redémarrages	2
Nombre d'arrêts	2
Causes d'arrêt	charge du robot; Arrêt caméra faux positif; redémarrage pour fix du rtk

Évaluation du travail

Appréciation de la qualité	Neutre
Dommages aux cultures	Faible

Avant travail



Après travail



Indicateurs de performance

Agronomique ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Espèce cultivée	Carottes et Radis	
Stade de croissance	Levée	
Texture sol	Limon argileux	
Humidité sol	Friable optimal	
Pression adventices	5	%
Opération planifiée	Grattage	
Qualité travail	Neutre	
Dégâts culture	Faible	


Énergie ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC début mission	62.20	%
SOC fin mission	69.70	%
Décharge totale ^[3] <i>Pour une capacité du pack batterie de : 2.54 kWh</i>	78.99	%
Énergie totale consommée	2.01	kWh

Indicateur	Valeur	Unité
Puissance moyenne	0.35	kW
Énergie par hectare	5.72	kWh/ha
Autonomie par batterie <i>Batterie de référence : 2.54 kWh</i>	0.44	ha/batterie

Débit de chantier ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Débit de chantier ^[5]	0.06	ha/h
Surface parcourue ^[6]	0.35	ha
Surface de parcelle travaillée ^[7]	0.10	ha
Surface travaillée ^[8]	0.29	ha
Surface effective ^[9]	0.08	ha
Taux recouvrement ^[10]	277.31	%
Vitesse moyenne (km/h)	1.77	km/h
Vitesse max (km/h)	3.60	km/h

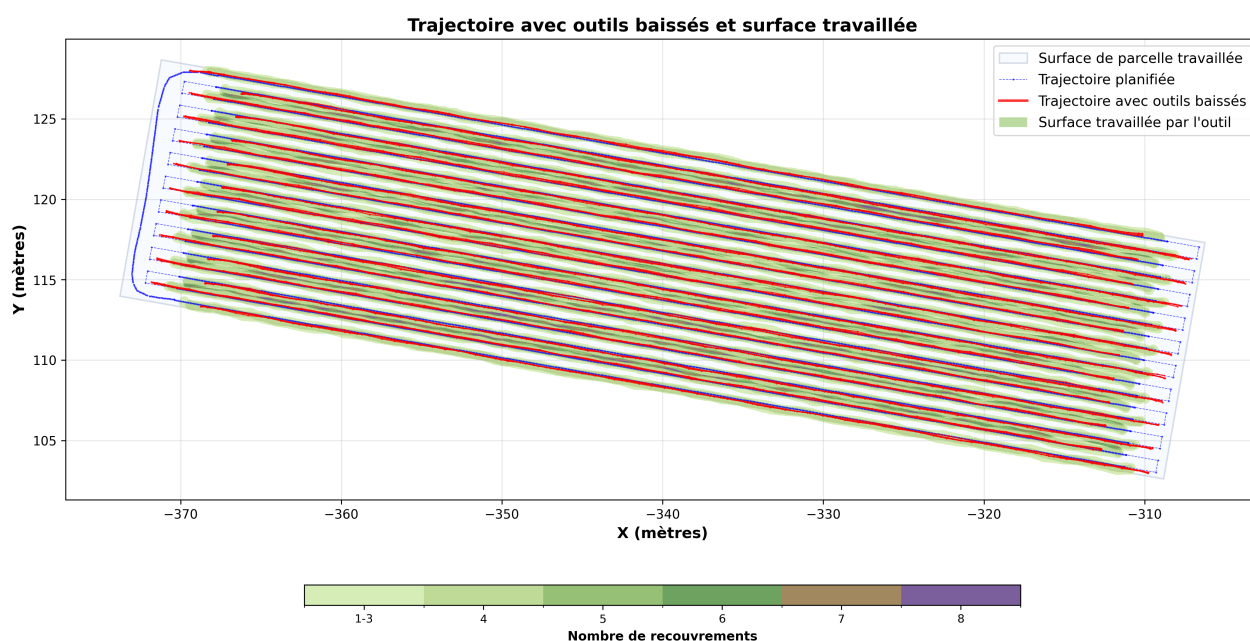

Économique ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prix électricité	0.19	€/kWh
Coût main-d'œuvre/heure	18.00	€/h
Employés affectés	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Coût MO/ha	0.00	€/ha
Coût énergie	0.38	€
Coût énergie/ha	1.09	€/ha
Coût total	0.38	€
Coût total/ha	1.09	€/ha

Environnemental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Température	17	°C
Type de précipitation	Aucune	
Émissions de CO ₂ ^[13] <i>Référence d'émission appliquée : 317 g de CO₂ par kWh.</i>	0.64	kg
Fragmentation parcelle	Consolidé (<0,5 km)	

Mission ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distance planifiée ^[15]	1308.97	m
Distance effectuée ^[16]	5490.98	m
Écart distance	4182.01	m
Distance effectuée (%)	419.49	%
Déviations latérales moyennes <i>Hors demi-tour</i>	7.48	cm
Déviations latérales max <i>Hors demi-tour</i>	19.95	cm
Déviations latérales moyennes (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	9.18	cm
Déviations latérales max (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	20.00	cm
Rangs travaillés ^[17]	21	

Opérationnel ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Poids robot	280.00	kg
Poids outil	15.00	kg
Poids total	295.00	kg

Indicateur	Valeur	Unité
Énergie/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Couple moyen au travail (% nominal) ^[19] <i>Couple nominal de référence : 2.39 N·m — Nombre de moteurs : 2.</i>	40.88	%

Sécurité ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Sorties géofencing	0	
Temps hors géofencing (s)	0.00	s
Temps hors géofencing (h)	0.00	h
Arrêts d'urgence locaux	0	
Arrêts d'urgence à distance	0	
Activations bumper	0	

Fiabilité ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs sorties	0	
Erreurs entrées	0	
Erreurs batterie	0	
Erreurs moteurs	2	
Erreurs vérins	2	
Total erreurs	4	
Temps en erreur sorties (s)	0.00	s
Temps en erreur entrées (s)	0.00	s
Temps en erreur batterie (s)	0.00	s
Temps en erreur moteurs (s)	381.07	s
Temps en erreur vérins (s)	381.41	s
Temps en erreur global (s)	382.91	s
Taux erreurs/h	0.71	/h
Disponibilité système	98.12	%

Localisation ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs localisation	12	
Temps en erreur (s)	7955.82	s

Indicateur	Valeur	Unité
Temps en erreur (h)	2 . 21	h

Temps ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durée totale	20377 . 10	s
Durée totale (heures)	5 . 66	h
Temps actif	9805 . 80	s
Temps actif (heures)	2 . 72	h
Temps inactif	10571 . 30	s
Temps inactif (heures)	2 . 94	h
Temps actif (%)	48 . 12	%
Temps inactif (%)	51 . 88	%

Mission 2

Date de l'essai	2026-03-18
Lieu	SABI AGRI, Auvergne, France
Opérateur	Nicolas
Heure de début	15:35
Heure de fin	16:29
Météo	
Type de précipitation	Aucune
Température	17 °C
Position du soleil	Zenith
Terrain	
Pente	0 %
Pente transversale	0 %
Sol	
Texture	Limon argileux
Taille de particule dominante	Pierres 20-200 mm
Condition d'humidité	Friable optimal
Culture	
Espèce	Carottes et Radis
Stade de croissance	Préparation du sol
Pression des adventices	5 %
Opération planifiée	Préparation du sol
Environnement adjacent	
Végétation haute	Non
Bâtiments élevés	Non
Structures métalliques	Oui
Fossé ou talus	Oui
Lignes haute tension	Non
Routes	Non
Zone sans réseau	Non
Configuration robot	
Poids du robot	280 kg
Largeur du robot	0.64 m

Outil

Nom de l'outil	Bineuse, 4 puis 2 dents
Type d'outil	Tiré
Poids de l'outil	30 kg
Longueur de l'outil	0.8 m
Largeur de l'outil	0.6 m
Hauteur de l'outil	0.6 m
Longueur totale de l'outil	1.1 m
Profondeur de travail	0.05 m



Figure 2.1: Photo de présentation de la mission

Présentation de la mission

Paramètres de mission

Tâche à effectuer	Préparation du sol
Trajectoire	Rectiligne, square turn
Vitesse de travail	1.8 km/h
Fichier de mission	faux_semis_1_2.json

Organisation

Main d'œuvre

Nombre total d'employés	1
-------------------------	---

Surface

Surface théorique de la parcelle	0.08 ha
Surface de parcelle travaillée	0.1047 ha
Fragmentation des parcelles	Consolidé (<0,5 km)

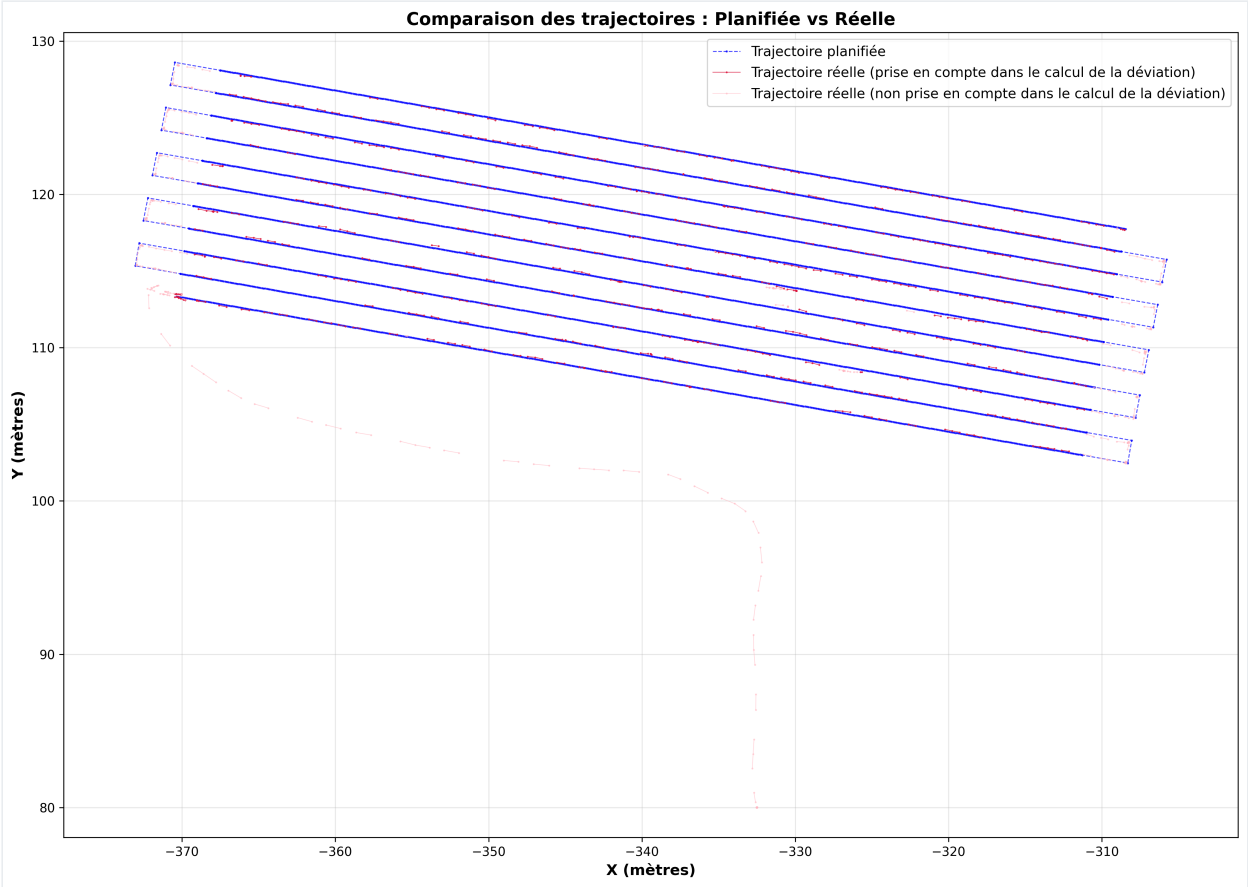


Figure 2.1: Comparaison trajectoire planifiée vs réelle

Synthèse Agronomique

Énergie par hectare	6.40 kWh/ha
Débit de chantier	0.07 ha/h
Autonomie par batterie	0.40 ha/batterie
Suivi du temps	
Réglage outils	10 min
Attente connexion GPS	0 min
Attente connexion Wi-Fi	0 min
Temps supervision	40 min
Déplacement	5 min
Nombre de redémarrages	0
Nombre d'arrêts	3
Causes d'arrêt	Moteurs force trop; Décalage trajectoire; modification outils, passage de 4 à 2 dents
Évaluation du travail	
Appréciation de la qualité	Peu satisfait

Avant travail



Après travail



Indicateurs de performance

Agronomique ^[1]


Indicateur	Valeur	Unité
Espèce cultivée	Carottes et Radis	
Stade de croissance	Préparation du sol	
Texture sol	Limon argileux	
Humidité sol	Friable optimal	
Pression adventices	5	%
Opération planifiée	Préparation du sol	
Qualité travail	Peu satisfait	
Dégâts culture	N/A	

Énergie ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC début mission	69.70	%
SOC fin mission	57.10	%
Décharge totale ^[3] <i>Pour une capacité du pack batterie de : 2.54 kWh</i>	13.19	%
Énergie totale consommée	0.34	kWh
Puissance moyenne	0.43	kW
Énergie par hectare	6.40	kWh/ha
Autonomie par batterie <i>Batterie de référence : 2.54 kWh</i>	0.40	ha/batterie

Débit de chantier ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Débit de chantier ^[5]	0.07	ha/h
Surface parcourue ^[6]	0.05	ha
Surface de parcelle travaillée ^[7]	0.10	ha
Surface travaillée ^[8]	0.04	ha
Surface effective ^[9]	0.04	ha
Taux recouvrement ^[10]	0.29	%
Vitesse moyenne (km/h)	1.17	km/h
Vitesse max (km/h)	3.60	km/h

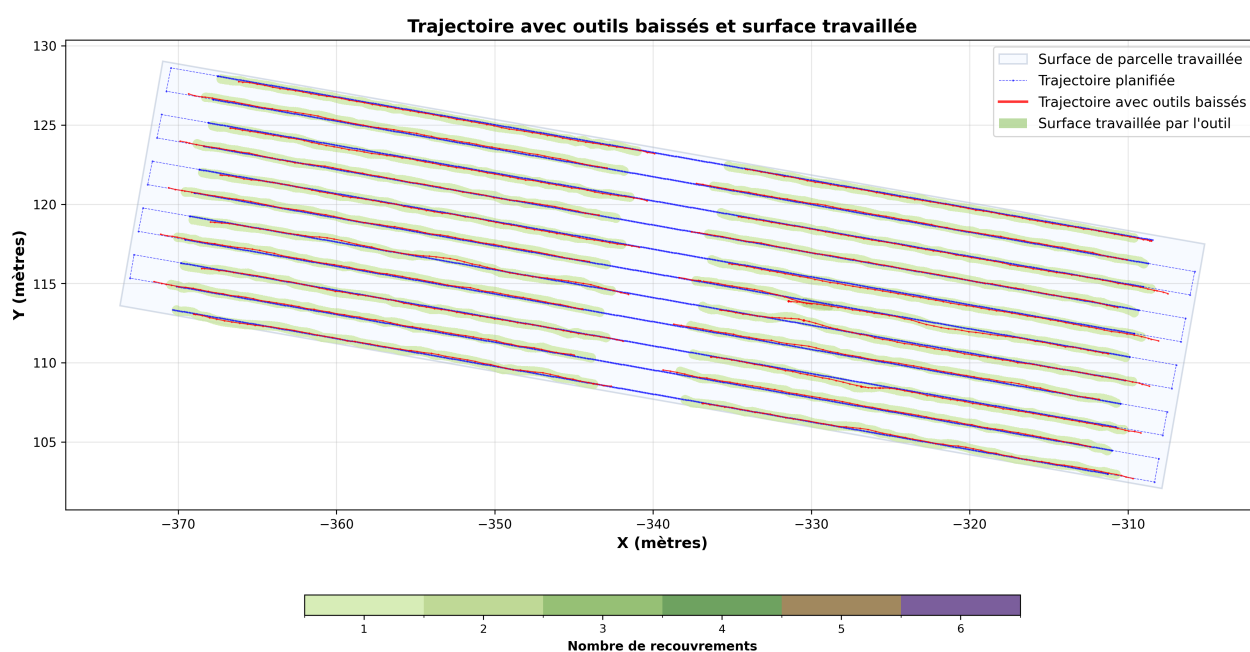

Économique ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prix électricité	0.19	€/kWh
Coût main-d'œuvre/heure	18.00	€/h
Employés affectés	0	
Coût MO/ha	0.00	€/ha
Coût énergie	0.06	€
Coût énergie/ha	1.22	€/ha
Coût total	0.06	€
Coût total/ha	1.22	€/ha

Environnemental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Température	17	°C
Type de précipitation	Aucune	
Émissions de CO ₂ ^[13] <i>Référence d'émission appliquée : 317 g de CO₂ par kWh.</i>	0.11	kg
Fragmentation parcelle	Consolidé (<0,5 km)	

Mission ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distance planifiée ^[15]	734.76	m
Distance effectuée ^[16]	819.83	m
Écart distance	85.06	m
Distance effectuée (%)	111.58	%
Déviations latérales moyennes <i>Hors demi-tour</i>	6.54	cm
Déviations latérales max <i>Hors demi-tour</i>	19.98	cm
Déviations latérales moyennes (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	9.32	cm
Déviations latérales max (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	19.82	cm
Rangs travaillés ^[17]	11	

Opérationnel ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Poids robot	280.00	kg
Poids outil	30.00	kg
Poids total	310.00	kg
Énergie/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Couple moyen au travail (% nominal) ^[19] <i>Couple nominal de référence : 2.39 N·m — Nombre de moteurs : 2.</i>	54.09	%

Sécurité ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Sorties géofencing	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Temps hors géofencing (s)	0.00	s
Temps hors géofencing (h)	0.00	h
Arrêts d'urgence locaux	0	
Arrêts d'urgence à distance	0	
Activations bumper	0	

Fiabilité ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs sorties	0	
Erreurs entrées	0	
Erreurs batterie	0	
Erreurs moteurs	0	
Erreurs vérins	1	
Total erreurs	1	
Temps en erreur sorties (s)	N/A	s
Temps en erreur entrées (s)	N/A	s
Temps en erreur batterie (s)	N/A	s
Temps en erreur moteurs (s)	0.00	s
Temps en erreur vérins (s)	0.10	s
Temps en erreur global (s)	0.10	s
Taux erreurs/h	1.24	/h
Disponibilité système	100.00	%

Localisation ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs localisation	0	
Temps en erreur (s)	0.00	s
Temps en erreur (h)	0.00	h

Temps ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durée totale	2898.09	s
Durée totale (heures)	0.81	h
Temps actif	1924.89	s

Indicateur	Valeur	Unité
Temps actif (heures)	0 . 53	h
Temps inactif	973 . 20	s
Temps inactif (heures)	0 . 27	h
Temps actif (%)	66 . 42	%
Temps inactif (%)	33 . 58	%

Mission 3

Date de l'essai	2026-03-18
Lieu	SABI AGRI, Auvergne, France
Opérateur	Nicolas
Heure de début	16:30
Heure de fin	17:31
Météo	
Type de précipitation	Aucune
Température	17 °C
Position du soleil	Zenith
Terrain	
Pente	0 %
Pente transversale	0 %
Sol	
Texture	Limon argileux
Taille de particule dominante	Pierres 20-200 mm
Condition d'humidité	Friable optimal
Culture	
Espèce	Carottes et Radis
Stade de croissance	Sol nu
Pression des adventices	5 %
Opération planifiée	Grattage
Environnement adjacent	
Végétation haute	Non
Bâtiments élevés	Non
Structures métalliques	Oui
Fossé ou talus	Oui
Lignes haute tension	Non
Routes	Non
Zone sans réseau	Non
Configuration robot	
Poids du robot	280 kg
Largeur du robot	0.64 m

Outil

Nom de l'outil	Herse etri
Type d'outil	Tiré
Poids de l'outil	15 kg
Longueur de l'outil	0.8 m
Largeur de l'outil	0.6 m
Hauteur de l'outil	0.6 m
Longueur totale de l'outil	1.1 m
Profondeur de travail	0.05 m



Figure 3.1: Photo de présentation de la mission

Présentation de la mission

Paramètres de mission

Tâche à effectuer	Préparation du sol
Trajectoire	Rectiligne, square turn
Vitesse de travail	3.6 km/h
Fichier de mission	herse_1_2.json

Organisation

Main d'œuvre

Nombre total d'employés	1
-------------------------	---

Surface

Surface théorique de la parcelle	0.08 ha
Surface de parcelle travaillée	0.1047 ha
Fragmentation des parcelles	Consolidé (<0,5 km)

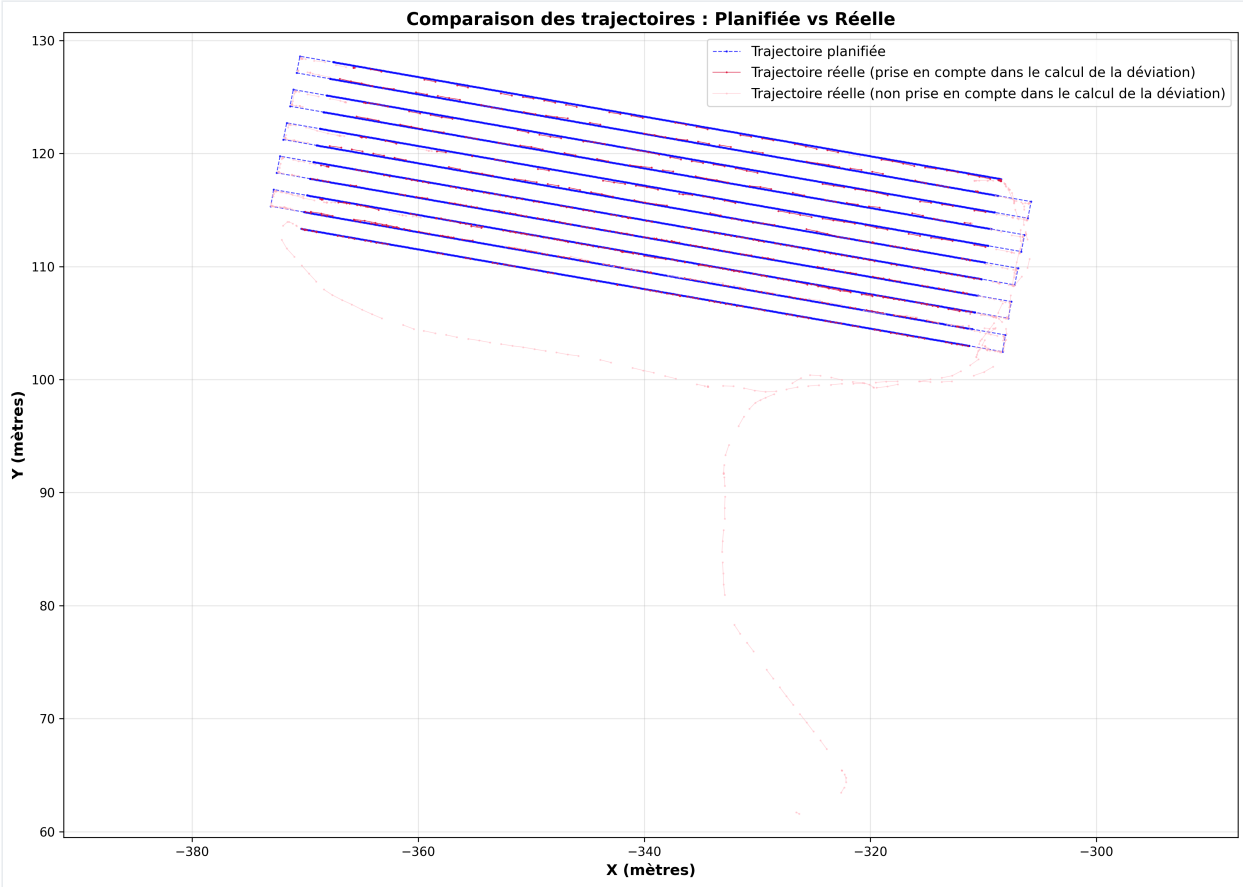


Figure 3.1: Comparaison trajectoire planifiée vs réelle

Synthèse Agronomique

Énergie par hectare	5.12 kWh/ha
Débit de chantier	0.07 ha/h
Autonomie par batterie	0.50 ha/batterie
Suivi du temps	
Réglage outils	2 min
Attente connexion GPS	0 min
Attente connexion Wi-Fi	0 min
Temps supervision	30 min
Déplacement	5 min
Nombre de redémarrages	0
Nombre d'arrêts	6
Causes d'arrêt	Sortie de traj (vitesse très élevée)
Évaluation du travail	
Appréciation de la qualité	Globalement satisfait

Avant travail



Après travail



Indicateurs de performance

Agronomique ^[1]


Indicateur	Valeur	Unité
Espèce cultivée	Carottes et Radis	
Stade de croissance	Sol nu	
Texture sol	Limon argileux	
Humidité sol	Friable optimal	
Pression adventices	5	%
Opération planifiée	Grattage	
Qualité travail	Globalement satisfait	
Dégâts culture	Aucun	

Énergie ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC début mission	57.10	%
SOC fin mission	58.80	%
Décharge totale ^[3] <i>Pour une capacité du pack batterie de : 2.54 kWh</i>	13.57	%
Énergie totale consommée	0.35	kWh
Puissance moyenne	0.53	kW
Énergie par hectare	5.12	kWh/ha
Autonomie par batterie <i>Batterie de référence : 2.54 kWh</i>	0.50	ha/batterie

Débit de chantier ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Débit de chantier ^[5]	0.07	ha/h
Surface parcourue ^[6]	0.07	ha
Surface de parcelle travaillée ^[7]	0.10	ha
Surface travaillée ^[8]	0.05	ha
Surface effective ^[9]	0.04	ha
Taux recouvrement ^[10]	13.32	%
Vitesse moyenne (km/h)	1.70	km/h
Vitesse max (km/h)	3.60	km/h

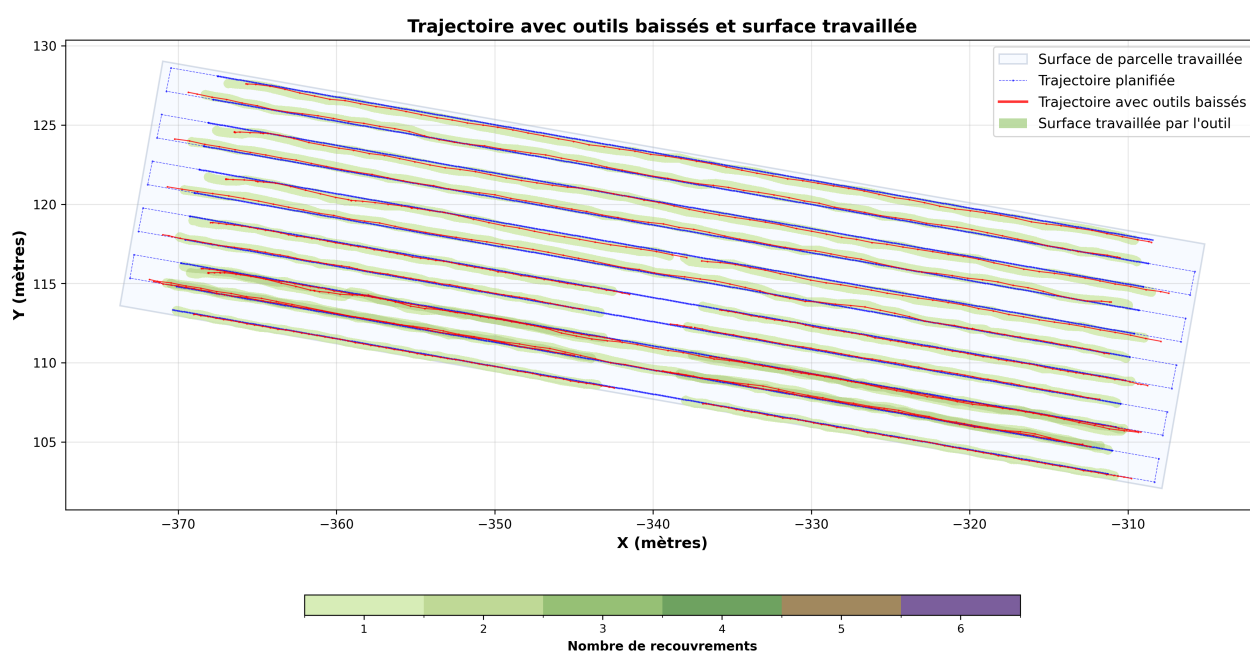

Économique ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prix électricité	0.19	€/kWh
Coût main-d'œuvre/heure	18.00	€/h
Employés affectés	0	
Coût MO/ha	0.00	€/ha
Coût énergie	0.07	€
Coût énergie/ha	0.97	€/ha
Coût total	0.07	€
Coût total/ha	0.97	€/ha

Environnemental ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Température	17	°C
Type de précipitation	Aucune	
Émissions de CO ₂ ^[13] <i>Référence d'émission appliquée : 317 g de CO₂ par kWh.</i>	0.11	kg
Fragmentation parcelle	Consolidé (<0,5 km)	

Mission ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distance planifiée ^[15]	734.76	m
Distance effectuée ^[16]	1054.41	m
Écart distance	319.64	m
Distance effectuée (%)	143.50	%
Déviations latérales moyennes <i>Hors demi-tour</i>	7.60	cm
Déviations latérales max <i>Hors demi-tour</i>	19.95	cm
Déviations latérales moyennes (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	8.75	cm
Déviations latérales max (outil) <i>Hors demi-tour, distance outil : 110 cm</i>	19.92	cm
Rangs travaillés ^[17]	11	

Opérationnel ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Poids robot	280.00	kg
Poids outil	15.00	kg
Poids total	295.00	kg
Énergie/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Couple moyen au travail (% nominal) ^[19] <i>Couple nominal de référence : 2.39 N·m — Nombre de moteurs : 2.</i>	50.79	%

Sécurité ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Sorties géofencing	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Temps hors géofencing (s)	0.00	s
Temps hors géofencing (h)	0.00	h
Arrêts d'urgence locaux	0	
Arrêts d'urgence à distance	0	
Activations bumper	0	

Fiabilité ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs sorties	0	
Erreurs entrées	0	
Erreurs batterie	0	
Erreurs moteurs	1	
Erreurs vérins	1	
Total erreurs	2	
Temps en erreur sorties (s)	0.00	s
Temps en erreur entrées (s)	0.00	s
Temps en erreur batterie (s)	0.00	s
Temps en erreur moteurs (s)	51.20	s
Temps en erreur vérins (s)	51.34	s
Temps en erreur global (s)	52.04	s
Taux erreurs/h	2.06	/h
Disponibilité système	98.51	%

Localisation ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Erreurs localisation	5	
Temps en erreur (s)	1327.41	s
Temps en erreur (h)	0.37	h

Temps ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durée totale	3493.07	s
Durée totale (heures)	0.97	h
Temps actif	1722.61	s

Indicateur	Valeur	Unité
Temps actif (heures)	0 . 48	h
Temps inactif	1770 . 46	s
Temps inactif (heures)	0 . 49	h
Temps actif (%)	49 . 32	%
Temps inactif (%)	50 . 68	%

Descriptions des indicateurs

Les numéros entre crochets renvoient aux définitions, hypothèses et sources détaillées ci-dessous.

- [1] Indicateur agronomique : valeur issue du contexte culturel saisi ou associé à l'essai.
- [2] Indicateur énergie : valeur dérivée des mesures électriques, de la consommation et du SOC enregistrés pendant la mission.
- [3] Décharge totale (%): énergie consommée pendant la mission (variation du cumul d'énergie en kWh) divisée par la capacité nominale du pack batterie (kWh), multipliée par 100. Cet indicateur ne s'appuie pas sur le SOC début ou fin ; la capacité de référence du pack est rappelée dans la note lorsqu'elle est connue.
- [4] Indicateur de débit de chantier : valeur dérivée des surfaces, vitesses et temps sur parcelle.
- [5] Débit de chantier : représente la quantité de travail réalisée par unité de temps, en ha/h. Débit horaire = surface parcourue (ha) ÷ durée totale de la mission (h).
- [6] Surface parcourue : il s'agit de la surface balayée par le robot = distance odométrique cumulée × largeur du robot.
- [7] Surface de parcelle travaillée : il s'agit de la surface de la parcelle travaillée par le robot. Elle est modélisée par une boîte orientée (OBB) avec une marge égale à la demi-largeur du robot autour de la trajectoire planifiée qui a été travaillée.
- [8] Surface travaillée : il s'agit de la surface travaillée par l'outil (largeur d'outil × longueur de la trajectoire avec outil baissé). Chaque passage compte : les recouvrements s'additionnent.
- [9] Surface effective : il s'agit de la surface travaillée par l'outil en excluant les recouvrements.
- [10] Taux de recouvrement : il s'agit du taux de recouvrement de la surface travaillée par rapport à la surface effective. (surface travaillée – surface effective) / surface effective × 100. Un taux élevé indique beaucoup de passages sur les mêmes zones.
- [11] Indicateur économique : valeur calculée à partir des paramètres de coût et des agrégats énergie / temps de mission.
- [12] Indicateur environnemental : valeur dérivée des conditions météo ou de la consommation selon la méthode documentée.
- [13] Émissions de CO₂ pour l'électricité consommée pendant la mission (kWh consommés × 0,317 kg/kWh). Source : Statistiques du développement durable — Chiffres clés du climat (édition numérique), chapitre sur les émissions de GES de l'industrie / production d'électricité (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
- [14] Indicateur mission : valeur dérivée du trajet réel, du plan et des écarts géométriques calculés.
- [15] Distance théorique de la mission : longueur cumulée de la trajectoire planifiée issue du fichier JSON de mission. Ne correspond pas au trajet réel du robot.
- [16] Distance réellement parcourue par le robot. Peut inclure des déplacements avant le démarrage effectif de la mission et après la fin, selon les données enregistrées.
- [17] Nombre de rang distincts travaillés (outil baissé).
- [18] Indicateur opérationnel : valeur dérivée de la cinématique, de l'outil ou des masses documentées.
- [19] Moyenne des couples en valeur absolue uniquement lorsque l'outil est baissé, en % du couple nominal des moteurs.
- [20] Indicateur sécurité : valeur dérivée des événements et durées liés aux fonctions de sécurité du robot.
- [21] Indicateur fiabilité : valeur dérivée des codes défaut et du temps passé en erreur par sous-système.
- [22] Indicateur de localisation : valeur dérivée des erreurs ou interruptions de localisation pendant la mission.
- [23] Indicateur temporel : valeur dérivée des horodatages et des états d'activité sur la mission.
